

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

VERSÃO

v2.0

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Execução 80% do planejado • SLA 0%

Planejadas 60 atividades e executadas 48, indicando execução abaixo do planejado, com necessidade de recomposição.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS

60

ATIVIDADES EXECUTADAS

48

EXECUÇÃO DO PLANO

80%

BACKLOG

12

VENCIDAS

12

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

Execução 80% do planejado • SLA 0%

Planejadas 60 atividades e executadas 48, indicando execução abaixo do planejado, com necessidade de recomposição.

LEITURA DO MÊS

O período encerrou com 48 entregas sobre 60 planejadas (80%), com execução abaixo do planejado, com necessidade de recomposição.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado. Backlog de 12 atividades. 12 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

IMPACTO OPERACIONAL

O backlog e os vencimentos pressionam a capacidade instalada e exigem priorização imediata no próximo ciclo.

SLA E COMPLIANCE

SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%, com 0 pendências parciais.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com redistribuição de equipes e ajustes no sequenciamento de atividades. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA E RITMO

Execução 80% do planejado (48 de 60).

DESVIOS CRÍTICOS

Backlog 12 • Vencidas 12 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com redistribuição de equipes e ajustes no sequenciamento de atividades.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


93

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 80% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (18 atividades). Backlog máximo em S4 (12). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.


Evolução semanal

Planejadas vs executadas

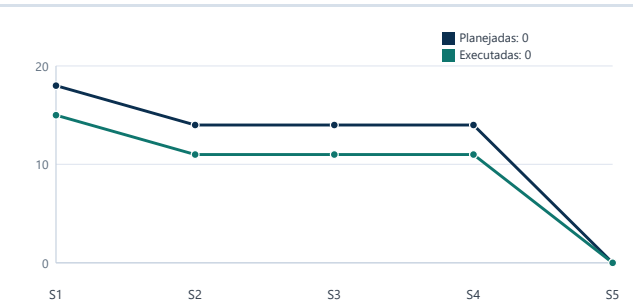

Evolução de backlog

Cumulativo no período

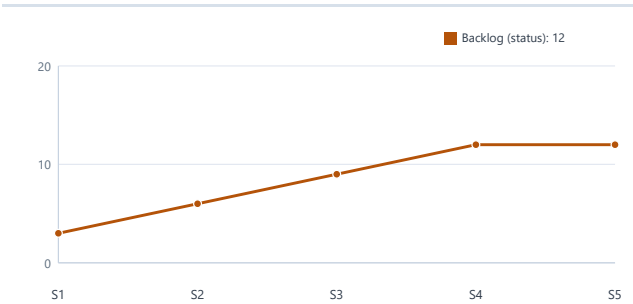


Distribuição por status

Planejadas



SLA no prazo vs fora do prazo

Percentual

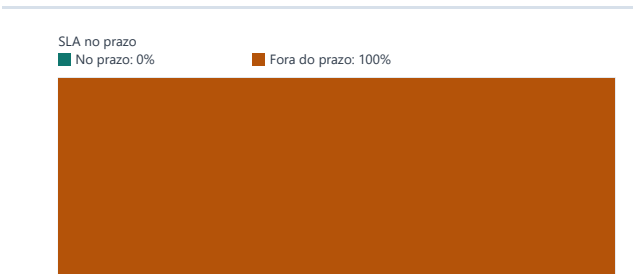

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.


Há exigências documentais indeterminadas; revisar cadastro de categorias.

Análise operacional

Distribuição das atividades planejadas por status, categoria, local, equipe e prioridade. A operação concentrou-se em categoria Corretiva Eletrica, local Não informado, equipe Não informado. Prioridade dominante: Alta.

Distribuição por categoria

Top categorias

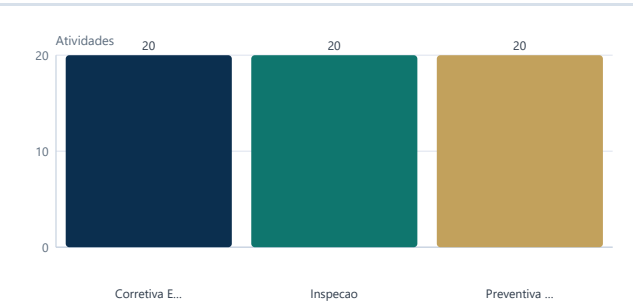


Top locais

Volume por local



Criticidade por prioridade

Distribuição

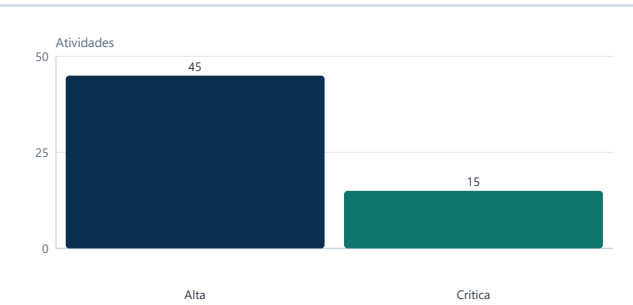

Distribuição por status

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Distribuição por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	60	100%

Distribuição por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	60	100%

Distribuição por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Há atividades com exigências documentais não classificadas. Evidências registradas: 93. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
32	32	0	16	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Volume total de 60 atividades, com 48 executadas.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO

Maior concentração em Corretiva Eletrica (20 atividades).

PENDÊNCIAS RELEVANTES

12 atividades em backlog; 12 vencidas; 15 críticas.

AÇÃO RECOMENDADA

Revisar criticidade e reprogramar frentes com maior impacto no SLA.

- Foram registradas 15 atividades críticas no período.
- Prioridade dominante: Alta (45 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e pode aumentar prazos médios de entrega.

Atividades vencidas elevam risco de descumprimento contratual e SLA.

SLA abaixo da meta sugere necessidade de replanejamento e ajuste de capacidade.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária
Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com visão completa do período para auditoria e revisão gerencial.

Status consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Locais consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	60	100%

Equipes consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	60	100%

Prioridades consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-02 ID: R1

Emitido: 2026-03-02T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-03 ID: R2

Emitido: 2026-03-03T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-04 ID: R3

Emitido: 2026-03-04T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-05 ID: R4

Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-06 ID: R5

Emitido: 2026-03-06T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-07 ID: R6

Emitido: 2026-03-07T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-08 ID: R7

Emitido: 2026-03-08T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-09 ID: R8

Emitido: 2026-03-09T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-10 ID: R9

Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-11 ID: R10

Emitido: 2026-03-11T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-12 ID: R11

Emitido: 2026-03-12T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-13 ID: R12

Emitido: 2026-03-13T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-14 ID: R13

Emitido: 2026-03-14T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-15 ID: R14

Emitido: 2026-03-15T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-16 ID: R15

Emitido: 2026-03-16T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-17 ID: R16
Emitido: 2026-03-17T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-18 ID: R17
Emitido: 2026-03-18T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-19 ID: R18
Emitido: 2026-03-19T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3
