

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição e priorização no próximo ciclo.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

60

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

48

EXECUÇÃO DO PLANO

80%

BACKLOG

12

VENCIDAS

12

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 48 atividades no mês, sobre 60 planejadas (80%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição seletiva. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando necessidade de recomposição e ajustes de programação. Backlog de 12 atividades. 12 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 93. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos pressionam a capacidade e elevam o risco de desvio de SLA. SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, reprogramando frentes críticas e reforçando capacidade no próximo ciclo. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 48 de 60 planejadas (80%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 12 • Vencidas 12 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


93

Tendências e performance

A série semanal mostra desvio entre planejamento e execução, com 80% do plano entregue no mês. Pico de programação em S1 (18 atividades). Backlog máximo em S4 (12). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana

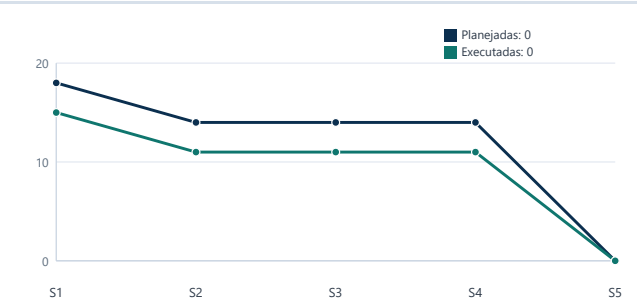


Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	60
Executadas (total)	48
Execução do plano	80%
Pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status

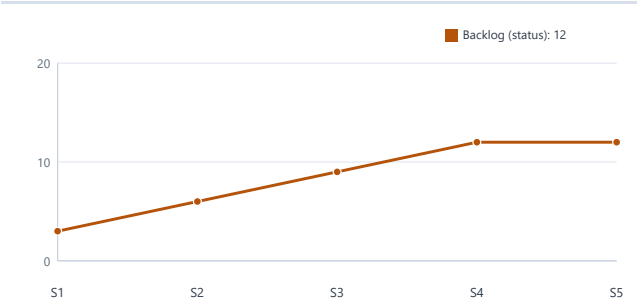

Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	12
Pico de backlog	12
Semana do pico	S4

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)



Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

Status com maior volume	Concluída
Total no período	60

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo recomposição e ajustes de programação.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.


Há exigências documentais indeterminadas; revisar cadastro de categorias.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Corretiva Eletrica, equipe O&M Boa Sorte II. A distribuição por categoria está coerente com o perfil do período. Prioridade mais frequente: Alta. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês

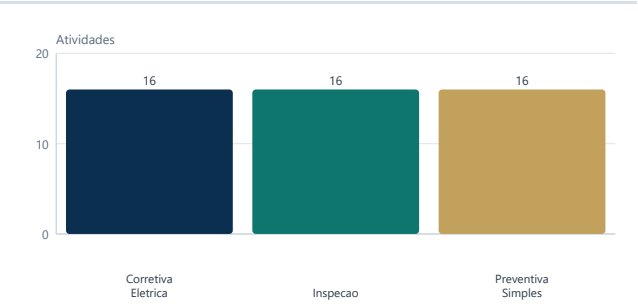


Leitura: mostra as frentes de maior esforço executado, sem julgamento operacional automático.

Categoria com maior volume	Corretiva Eletrica
Participação	33%

Execução por local

Atividades concluídas no mês

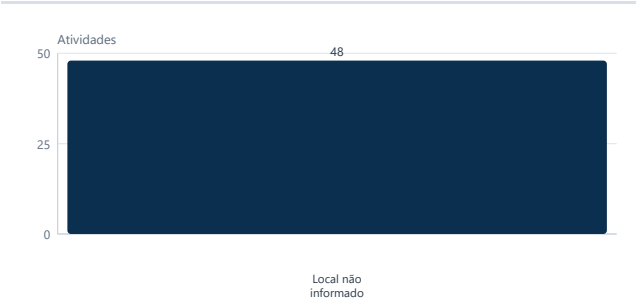


Leitura: distribuição por locais dentro do projeto, usada apenas como contexto operacional.

Locais com execução	1
Total executado	48

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas

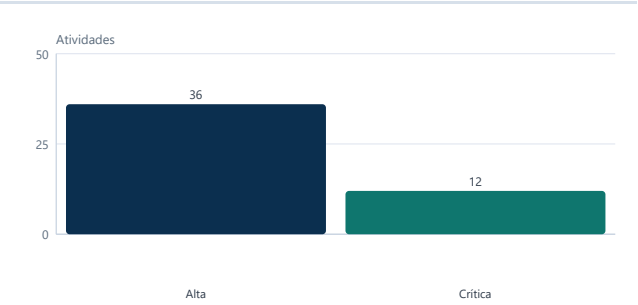

Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade com maior volume	Alta
Participação	75%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	60	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Há atividades com exigências documentais não classificadas. Evidências registradas: 93. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
32	32	0	16	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Planejamento de 60 atividades e execução de 48 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO Maior concentração nas frentes Corretiva Eletrica (16 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.	PENDÊNCIAS RELEVANTES 12 atividades em backlog; 12 vencidas; 15 críticas.
RISCOS RESIDUAIS Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.	AÇÃO RECOMENDADA Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.	

- Foram registradas 15 atividades críticas no período.
- Prioridade mais frequente: Alta (36 atividades).

Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

Sem contingências registradas no período.

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, vencimentos, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e requer priorização para manter o cronograma.

Atividades vencidas indicam atraso materializado e exigem recomposição de prazos.

SLA abaixo da meta sinaliza gargalo de execução e priorização.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

Backlog e justificativas

Motivos consolidados de não execução e backlog, agrupados por tema operacional.

Ausência de justificativa registrada

12

ATIVIDADE	VENCIMENTO	LOCAL	EQUIPE	JUSTIFICATIVA
Atividade 30	03/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 60	05/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 5	06/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 35	08/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 10	11/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 40	13/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 15	16/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 45	18/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 20	21/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 50	23/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 25	26/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 55	28/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária
Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	60	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	16	33%
Inspecao	16	33%
Preventiva Simples	16	33%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	48	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	48	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	36	75%
Crítica	12	25%

Anexo técnico diário

Consolidação diária dos RDOs emitidos no período, com evidências e resumo técnico.

RDO 02/03/2026 ID: R1
Emitido: 02/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 03/03/2026 ID: R2

Emitido: 03/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 04/03/2026 ID: R3

Emitido: 04/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 05/03/2026 ID: R4

Emitido: 05/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 06/03/2026 ID: R5

Emitido: 06/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 07/03/2026 ID: R6

Emitido: 07/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 08/03/2026 ID: R7

Emitido: 08/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 09/03/2026 ID: R8

Emitido: 09/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 10/03/2026 ID: R9

Emitido: 10/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 11/03/2026 ID: R10

Emitido: 11/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 12/03/2026 ID: R11

Emitido: 12/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 13/03/2026 ID: R12

Emitido: 13/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 14/03/2026 ID: R13

Emitido: 14/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 15/03/2026 ID: R14

Emitido: 15/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 16/03/2026 ID: R15

Emitido: 16/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 17/03/2026 ID: R16

Emitido: 17/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 18/03/2026 ID: R17

Emitido: 18/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 19/03/2026 ID: R18

Emitido: 19/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.
