

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

VERSÃO

v2.0

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Execução 80% do planejado • SLA 0%

Execução abaixo do plano, com necessidade de recomposição operacional.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS

60

ATIVIDADES EXECUTADAS

48

EXECUÇÃO DO PLANO

80%

BACKLOG

12

VENCIDAS

12

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

O período encerrou com 48 entregas sobre 60 planejadas (80%), com execução abaixo do planejado, com necessidade de recomposição.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou interferências operacionais. Backlog de 12 atividades. 12 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

IMPACTO OPERACIONAL

O backlog e os vencimentos pressionam a capacidade do time O&M Boa Sorte II e exigem priorização imediata no próximo ciclo.

SLA E COMPLIANCE

SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%, com 0 pendências parciais.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reorganização das frentes do time O&M Boa Sorte II e ajustes no sequenciamento de atividades. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA E RITMO

Execução 80% do planejado (48 de 60).

DESVIOS CRÍTICOS

Backlog 12 • Vencidas 12 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


93

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 80% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (18 atividades). Backlog máximo em S4 (12). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Evolução semanal

Planejadas vs executadas

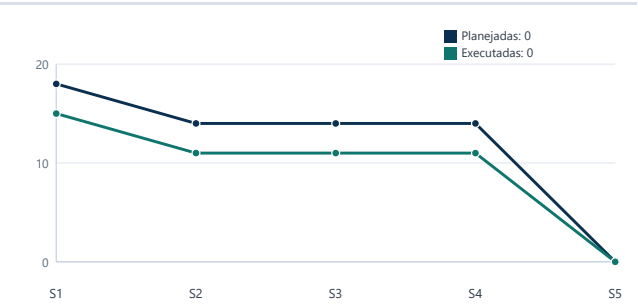


Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	60
Executadas (total)	48
Execução do plano	80%
Semana pico de planejamento	S1

Evolução de backlog

Cumulativo no período

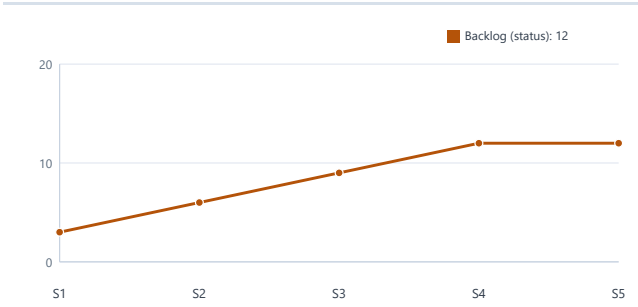

Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	12
Pico de backlog	12
Semana do pico	S4

Distribuição por status

Planejadas




Leitura: indica a composição do plano por status no período.

Status dominante	Concluída
Total planejadas	60

SLA no prazo vs fora do prazo

Percentual

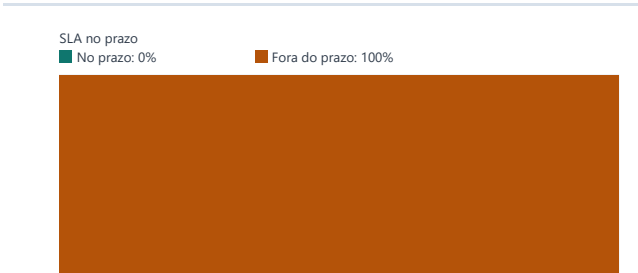

Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.


Há exigências documentais indeterminadas; revisar cadastro de categorias.

Análise operacional

Distribuição das atividades planejadas por status, categoria, local, equipe e prioridade. A operação concentrou-se em categoria Corretiva Eletrica, local Não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A distribuição por categoria não indica gargalos relevantes. Prioridade dominante: Alta.

Distribuição por categoria

Top categorias

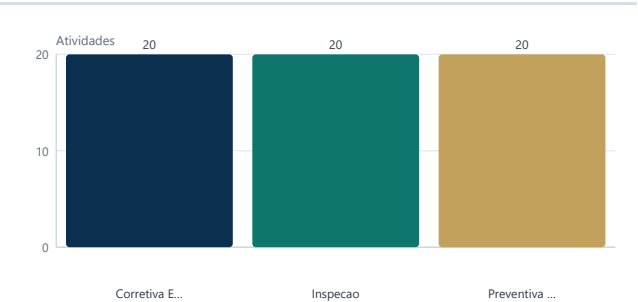

Leitura: indica concentração do esforço por tipo de atividade.

Categoria dominante	Corretiva Eletrica
Participação	33%

Top locais

Volume por local




Leitura: evidencia concentração geográfica do volume planejado.

Local dominante	Não informado
Participação	100%

Criticidade por prioridade

Distribuição

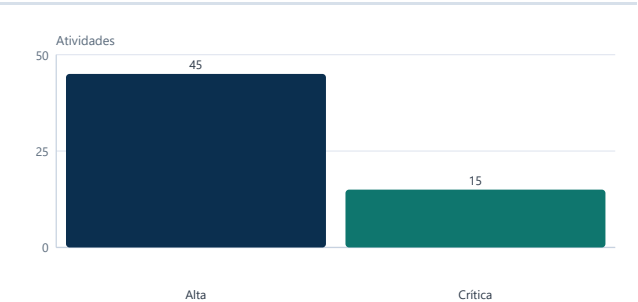

Leitura: identifica o peso de criticidade no volume planejado.

Prioridade dominante	Alta
Participação	75%

Distribuição por status

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Distribuição por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	60	100%

Distribuição por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Distribuição por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Há atividades com exigências documentais não classificadas. Evidências registradas: 93. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
32	32	0	16	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Volume total de 60 atividades, com 48 executadas.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO

Maior concentração em Corretiva Eletrica (20 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.

PENDÊNCIAS RELEVANTES

12 atividades em backlog; 12 vencidas; 15 críticas.

AÇÃO RECOMENDADA

Revisar criticidade e reprogramar frentes com maior impacto no SLA.

- Foram registradas 15 atividades críticas no período.
- Prioridade dominante: Alta (45 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e pode aumentar prazos médios de entrega.

Atividades vencidas elevam risco de descumprimento contratual e SLA.

SLA abaixo da meta sugere necessidade de replanejamento e ajuste de capacidade.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária
Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com visão completa do período para auditoria e revisão gerencial.

Status consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Locais consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	60	100%

Equipes consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Prioridades consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-02 ID: R1

Emitido: 2026-03-02T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-03 ID: R2

Emitido: 2026-03-03T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-04 ID: R3

Emitido: 2026-03-04T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-05 ID: R4

Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-06 ID: R5

Emitido: 2026-03-06T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-07 ID: R6

Emitido: 2026-03-07T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-08 ID: R7

Emitido: 2026-03-08T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-09 ID: R8

Emitido: 2026-03-09T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-10 ID: R9

Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-11 ID: R10

Emitido: 2026-03-11T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-12 ID: R11

Emitido: 2026-03-12T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-13 ID: R12

Emitido: 2026-03-13T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-14 ID: R13

Emitido: 2026-03-14T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-15 ID: R14

Emitido: 2026-03-15T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-16 ID: R15

Emitido: 2026-03-16T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-17 ID: R16

Emitido: 2026-03-17T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-18 ID: R17

Emitido: 2026-03-18T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-19 ID: R18

Emitido: 2026-03-19T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3
