

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição e priorização no próximo ciclo.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

60

● Programação ativa

Busca: volume planejado do mês.
Soma: atividades com dueDate no
período e status não cancelado.
Base: programação mensal.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

48

● Execução registrada

Busca: entregas concluídas no mês.
Soma: atividades com doneAt no
período e status concluída. Base:
execução real.

EXECUÇÃO DO PLANO

80%

● Fora da meta

Busca: aderência ao plano. Cálculo:
executadas ÷ planejadas. Meta ≥
90%.

BACKLOG

12

● Acima do ideal

Busca: pendências do mês. Soma: atividades planejadas no período com status backlog. Meta = 0.

VENCIDAS

12

● Com vencimentos

Busca: atraso vencido. Soma: dueDate até fim do mês sem conclusão até a data de corte. Meta = 0.

SLA NO PRAZO

0%

● Fora da meta

Busca: cumprimento de prazo. Base: concluídas no mês com dueDate. No prazo = $\text{doneAt} \leq \text{dueDate}$; fora do prazo = $100\% - \text{no prazo}$. Meta $\geq 90\%$.

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 48 atividades no mês, sobre 60 planejadas (80%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição seletiva. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando necessidade de recomposição e ajustes de programação. Backlog de 12 atividades. 12 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta. Taxa de corretivas em 33% indica paradas e falhas; oportunidade de reduzir recorrência.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 93. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos demandam priorização para manter previsibilidade de entrega. SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, reprogramando frentes críticas e reforçando capacidade no próximo ciclo. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 48 de 60 planejadas (80%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 12 • Vencidas 12 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

INTERCORRÊNCIAS ABERTAS

0

● Sem intercorrências

Busca: intercorrências/falhas abertas (status aberta ou em tratativa). Soma: registros de anomalias não corrigidas no período. Meta = 0.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

● Dentro da meta

Busca: documentação correta. Cálculo: docs OK ÷ docs exigidos em atividades concluídas. Meta ≥ 95%.

TAXA PREVENTIVA/PREDITIVA

33%

● Abaixo da meta

Busca: confiabilidade preventiva. Cálculo: preventivas/preditivas ÷ total executado no mês. Meta ≥ 70%.

TAXA CORRETIVA (PARADAS)

33%

● Acima da meta

Busca: exposição a corretivas. Cálculo: corretivas ÷ total executado no mês. Meta ≤ 25%.

HORAS EXECUTADAS

0h

● Sem registro

Busca: esforço aplicado. Soma: duração registrada ou diferença entre início e fim das execuções no mês.

EVIDÊNCIAS

93

● Com evidências


Busca: rastreabilidade visual. Soma: evidências anexadas nas atividades concluídas e RDOs do mês.

Tendências e performance

A série semanal mostra desvio entre planejamento e execução, com 80% do plano entregue no mês. Pico de programação em S1 (18 atividades). Backlog máximo em S4 (12). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana

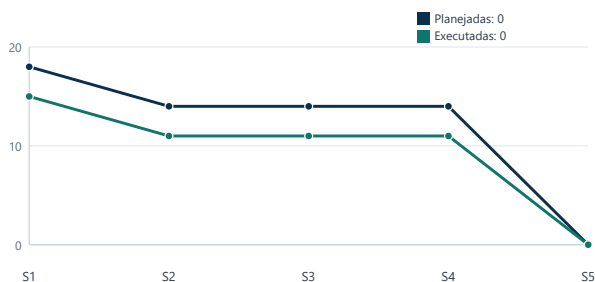


Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	60
Executadas (total)	48
Execução do plano	80%
Pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status

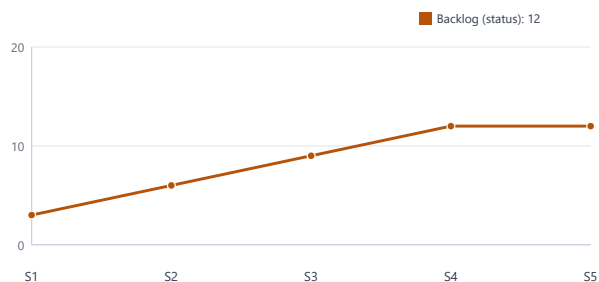

Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	12
Pico de backlog	12
Semana do pico	S4

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)




Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

Status com maior volume	Concluída
Total no período	60

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis (concluídas no mês com dueDate)



Leitura: no prazo = doneAt <= dueDate. Fora do prazo = 100% - no prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo recomposição e ajustes de programação.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas reforçam a necessidade de priorização de prazos.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Taxa de corretivas acima da meta indica paradas e pede redução de recorrências.


Conformidade documental dentro do padrão esperado.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Corretiva Elétrica, equipe O&M Boa Sorte II. A distribuição por categoria está coerente com o perfil do período. Preventivas/preditivas representam 33% do esforço executado, fortalecendo confiabilidade. Corretivas em 33% refletem demandas reativas; manter análise de causa raiz para reduzir recorrências. Prioridade mais frequente: Alta. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês

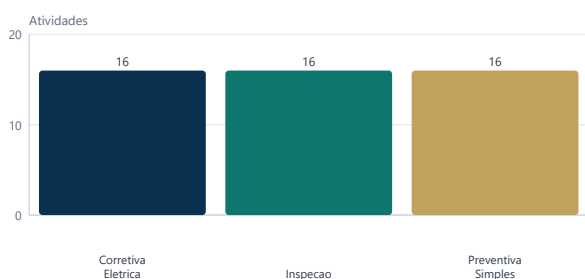


Leitura: destaca frentes preventivas/preditivas vs corretivas, sem perder contexto do esforço executado.

Categoria com maior volume	Corretiva Elétrica
Participação	33%
Preventivas/preditivas	16 (33%)
Corretivas	16 (33%)

Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: distribuição por locais dentro do projeto, usada apenas como contexto operacional.

Locais com execução	1
Total executado	48

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas

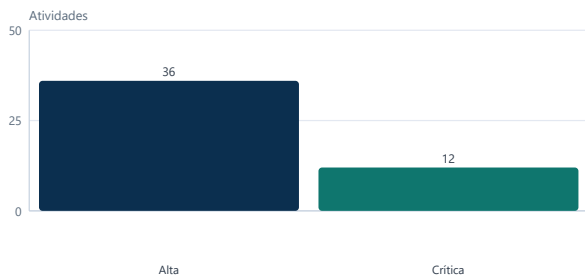

Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade com maior volume	Alta
Participação	75%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	60	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Há atividades com exigências documentais não classificadas. Evidências registradas: 93. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance. Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
32	32	0	16	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional. A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Planejamento de 60 atividades e execução de 48 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO Maior concentração nas frentes Corretiva Eletrica (16 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.	LEITURA PREVENTIVA VS CORRETIVA Preventivas/preditivas: 33% do esforço executado, reforçando confiabilidade e disciplina operacional. Corretivas em 33% sinalizam falhas e paradas; priorizar análise de causa raiz e redução de recorrência.
PENDÊNCIAS RELEVANTES 12 atividades em backlog; 12 vencidas; 15 críticas.	RISCOS RESIDUAIS Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.	AÇÃO RECOMENDADA Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.

- Foram registradas 15 atividades críticas no período.
- Prioridade mais frequente: Alta (36 atividades).

Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

Sem contingências registradas no período.

Intercorrências e falhas registradas

Ocorrências abertas com encaminhamento ao cliente.

Sem intercorrências abertas no período. Ocorrências já corrigidas não foram incluídas.

Sem intercorrências abertas no período.

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, vencimentos, SLA e compliance.

Nível de atenção elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta, taxa de corretivas acima da meta, alertas de integridade.

Backlog em aberto pede priorização para manter previsibilidade de prazos.

Atividades vencidas indicam necessidade de recomposição seletiva de prazos.

SLA abaixo da meta pede reequilíbrio de capacidade e priorização.

Taxa de corretivas em 33% indica paradas; priorizar análise de causa raiz e redução de recorrência.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.
- Revisar pontos de pressão na execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.
- Implantar plano de redução de falhas: análise de causa raiz, eliminação de recorrências e reforço preventivo.
- Elevar participação preventiva/preditiva para meta de confiabilidade, protegendo disponibilidade dos ativos.

Backlog e justificativas

Motivos consolidados de não execução e backlog, agrupados por tema operacional.

Ausência de justificativa registrada

12

ATIVIDADE	VENCIMENTO	LOCAL	EQUIPE	JUSTIFICATIVA
Atividade 30	03/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 60	05/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 5	06/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 35	08/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 10	11/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 40	13/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 15	16/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 45	18/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 20	21/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 50	23/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 25	26/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.
Atividade 55	28/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária
Revisar pontos de pressão na execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Priorit ária
Implantar plano de redução de falhas: análise de causa raiz, eliminação de recorrências e reforço preventivo.	Engenharia de Confiabilidade	Próximo ciclo	Priorit ária
Elevar participação preventiva/preditiva para meta de confiabilidade, protegendo disponibilidade dos ativos.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	60	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	16	33%
Inspecao	16	33%
Preventiva Simples	16	33%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	48	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	48	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	36	75%
Crítica	12	25%
