

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição de capacidade.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

60

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

48

EXECUÇÃO DO PLANO

80%

BACKLOG

12

VENCIDAS

12

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 48 atividades no mês, sobre 60 planejadas (80%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição. A execução considera conclusões registradas no mês, independentemente da programação.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou reprogramações operacionais. Backlog de 12 atividades. 12 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 93. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos pressionam a capacidade e elevam risco de desvio de SLA. SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reprogramação de frentes e reforço de capacidade no próximo ciclo. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 48 de 60 planejadas (80%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 12 • Vencidas 12 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


93

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 80% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (18 atividades). Backlog máximo em S4 (12). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Volume planejado vs executado por semana

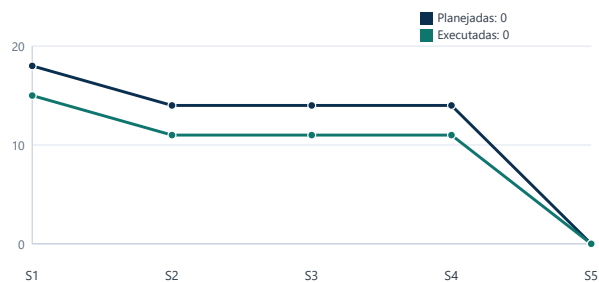


Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	60
Executadas (total)	48
Execução do plano	80%
Semana pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status

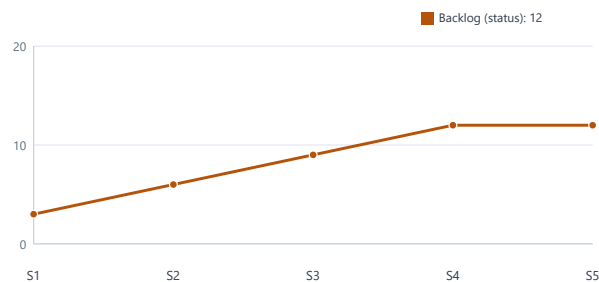

Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	12
Pico de backlog	12
Semana do pico	S4

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês




Leitura: concluídas são contabilizadas pelo doneAt dentro do mês, independentemente do mês planejado.

Status dominante	Concluída
Total no período	60

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis

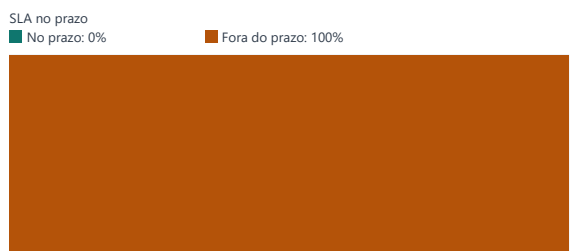

Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.


Há exigências documentais indeterminadas; revisar cadastro de categorias.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Corretiva Elétrica, local Local não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A distribuição por categoria não indica gargalos relevantes. Prioridade dominante: Alta.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês

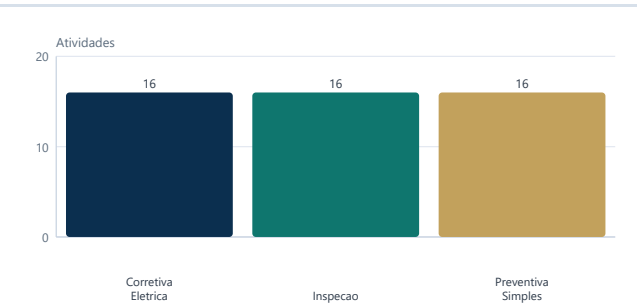


Leitura: mostra onde o esforço executado se concentrou no período.

Categoria dominante	Corretiva Elétrica
Participação	33%

Execução por local

Atividades concluídas no mês

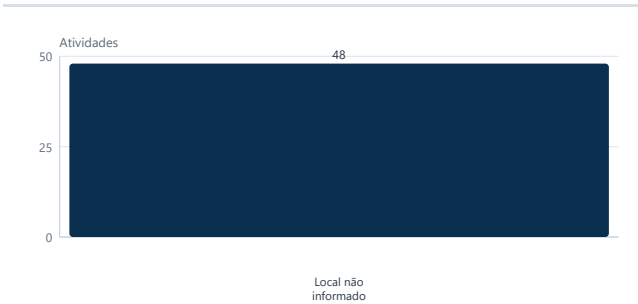


Leitura: evidencia concentração geográfica das entregas concluídas.

Local dominante	Local não informado
Participação	100%

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas

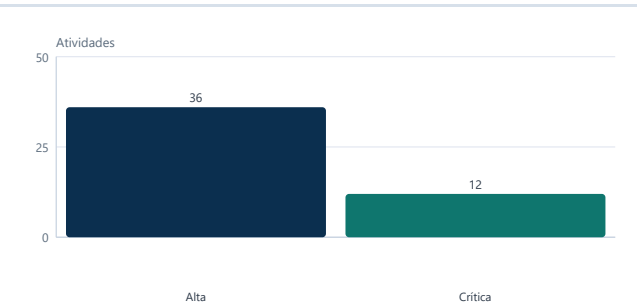

Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade dominante	Alta
Participação	75%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	60	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Há atividades com exigências documentais não classificadas. Evidências registradas: 93. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
32	32	0	16	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Planejamento de 60 atividades e execução de 48 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO

Maior concentração nas frentes Corretiva Eletrica (16 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.

PENDÊNCIAS RELEVANTES

12 atividades em backlog; 12 vencidas; 15 críticas.

RISCOS RESIDUAIS

Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.

AÇÃO RECOMENDADA

Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.

- Foram registradas 15 atividades críticas no período.
- Prioridade dominante: Alta (36 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e eleva risco de descumprimento do cronograma.

Atividades vencidas indicam atraso materializado e risco contratual.

SLA abaixo da meta sinaliza gargalo de execução e priorização.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem justificativas registradas para o backlog.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Prioritária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Prioritária
Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Prioritária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado e executado no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	48	80%
Backlog	12	20%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	20	33%
Inspecao	20	33%
Preventiva Simples	20	33%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	60	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	60	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	45	75%
Crítica	15	25%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Corretiva Eletrica	16	33%
Inspecao	16	33%
Preventiva Simples	16	33%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	48	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	48	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Alta	36	75%
Crítica	12	25%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-02 ID: R1
Emitido: 2026-03-02T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-03 ID: R2

Emitido: 2026-03-03T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-04 ID: R3

Emitido: 2026-03-04T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-05 ID: R4

Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-06 ID: R5

Emitido: 2026-03-06T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-07 ID: R6

Emitido: 2026-03-07T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-08 ID: R7

Emitido: 2026-03-08T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-09 ID: R8

Emitido: 2026-03-09T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-10 ID: R9

Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-11 ID: R10

Emitido: 2026-03-11T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-12 ID: R11

Emitido: 2026-03-12T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-13 ID: R12

Emitido: 2026-03-13T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-14 ID: R13

Emitido: 2026-03-14T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-15 ID: R14

Emitido: 2026-03-15T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-16 ID: R15

Emitido: 2026-03-16T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 4

RDO 2026-03-17 ID: R16

Emitido: 2026-03-17T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 1

RDO 2026-03-18 ID: R17

Emitido: 2026-03-18T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

RDO 2026-03-19 ID: R18

Emitido: 2026-03-19T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.
